



# **Informe de Avance de Proyectos del POA 2026**

Cierre del primer trimestre - al 31/03/2026

**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
Dirección de Planificación y Desarrollo

Abril 10, 2026

## Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial, a través de su Dirección de Planificación y Desarrollo, elabora anualmente el Plan Operativo Anual (POA), un instrumento clave para orientar las acciones y proyectos de la institución. Este proceso de planificación se lleva a cabo con la participación de las distintas áreas del Poder Judicial, permitiendo una visión integral de las necesidades y prioridades institucionales. El POA se somete a la revisión y aprobación del Consejo del Poder Judicial (CPJ), asegurando la alineación con la visión estratégica de la institución y su plan decenal **“Justicia del Futuro 2034”**, cuyo enfoque se sustenta en tres ejes estratégicos: **0% Mora, 100% Acceso y 100% Transparencia**, los cuales guían la implementación de proyectos y la asignación de recursos. Estos ejes representan el compromiso de la institución con la mejora continua y sostenibilidad en la administración de justicia con calidad, buscando eliminar la mora judicial, eficientizar los procesos, garantizar un acceso equitativo y oportuno a la justicia para toda la ciudadanía y promover la transparencia en todos los niveles del sistema judicial.

La planificación de los proyectos para el año 2026 se basa en estos tres ejes, teniendo como máxima el **“Poner en el centro a las personas”**, buscando garantizar su dignidad con un servicio de justicia eficiente y oportuno. Otros elementos que destacar y que se encuentran contemplados dentro de esta planificación son en la modernización de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal judicial y administrativo, y la optimización de los procesos internos. Además, se busca fortalecer la colaboración interinstitucional para garantizar que las políticas del Poder Judicial estén alineadas con las necesidades sociales y las expectativas de la población. Este enfoque estratégico para el 2026 no solo busca cumplir con los objetivos planteados, sino también crear un sistema judicial más eficiente, accesible y confiable, reflejando un compromiso firme con la justicia y el bienestar social.

El Plan Operativo Anual (POA) del Poder Judicial para el año 2026 se aprobó en el acta del Consejo del Poder Judicial núm. 06-2026, en su Sesión Ordinaria celebrada el 3 de marzo de 2026, con un total de 18 proyectos, de los cuales 5 corresponden a nuevas incorporaciones y 13 que vienen ejecutándose de años anteriores. En función del alcance definido para el año 2026, se ha asignado a los proyectos estratégicos un presupuesto de RD\$147,364,106.69, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución.

Cabe destacar que actualmente se lleva a cabo un proceso de reordenamiento presupuestario que asegura la asignación eficiente de recursos en función de las prioridades estratégicas del Poder Judicial, alineándose con las buenas prácticas de las metodologías ágiles de gestión de proyectos, las cuales promueven la adaptabilidad en la gestión organizacional, tanto operativa como estratégica. En función de esto, al cierre del 31/03/2026, los proyectos estratégicos tienen un presupuesto total asignado de RD\$178,821,241.00. De este valor, se tiene un total comprometido de RD\$63,229,430.22 y un valor disponible o pendiente de ejecución de RD\$115,591,811.08. Al cierre de este período, no se han realizado pagos vinculados a los proyectos, lo cual depende del avance de los procesos de adquisición, o compras y contrataciones correspondientes, que aún se encuentran en proceso.

Los proyectos aprobados para el POA 2026 son los siguientes:

Proyectos		Área responsable	
<b>Justicia ágil - 0% Mora</b>			
Optimización Procesal Penal	Dirección General de Administración y Carrera Judicial		
Optimización del Proceso Inmobiliario*	Dirección del Servicio Judicial y Operaciones		
Modelo Operativo & Sistema Integral de Gestión de Calidad	Dirección Planificación y Desarrollo		
Optimización de Notificaciones Judiciales*	Dirección del Servicio Judicial y Operaciones		
Implementación del Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	Dirección Financiera		
Sistema de Evaluación del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo	Dirección Gestión Humana		
Transformación Digital	Interoperabilidad de la Justicia	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	
	Implementación de IA en la Justicia	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	
	Optimización del Sistema de Gestión de Casos*	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	
	<b>Justicia accesible – 100% acceso</b>		
	Reingeniería y Optimización del Portal de Acceso y Servicios Digitales*	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	
	Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	Dirección Infraestructura Física	
	Modelo de Ciudad Judicial	Dirección Infraestructura Física	
	Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios*	Dirección del Servicio Judicial y Operaciones	
	Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	Dirección de Producción e Identidad Institucional	
	Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	Dirección de Justicia Inclusiva	
Justicia Juvenil Restaurativa	Dirección de Justicia Inclusiva		
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	Dirección de Justicia Inclusiva		
<b>Justicia transparente – 100% transparencia</b>			
Justicia abierta	Dirección de Análisis y Políticas Públicas		

(\*) Proyectos que inician en el año 2026. Los demás proyectos se vienen ejecutando de años anteriores.

**Nota:** El Programa de Transformación Digital está compuesto por los proyectos: Interoperabilidad de la Justicia, Implementación de IA en la Justicia, Optimización del Sistema de Gestión de Casos y Reingeniería y Optimización del Portal de Acceso y Servicios Digitales.

Como parte del seguimiento realizado a estos proyectos, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio, así como el porcentaje de avance general, siendo un **72.39%**, al corte del 31 de marzo del 2026.

## Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2026, al cierre del primer trimestre.

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 31 de marzo, la totalidad de los proyectos se encuentran en etapa de ejecución. En cuanto a las fases específicas, se tienen 9 proyectos en fase de despliegue (*incluido aquí el programa de Transformación Digital, el cual incluye 4 proyectos descritos previamente*) y 6 en fase de desarrollo. A continuación, se presentan las gráficas y tablas correspondientes a la distribución por etapas y fases, además del estatus de por Dirección General y por proyecto:

### Proyectos POA 2026 por Área Responsable/Etapa-Fase:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase

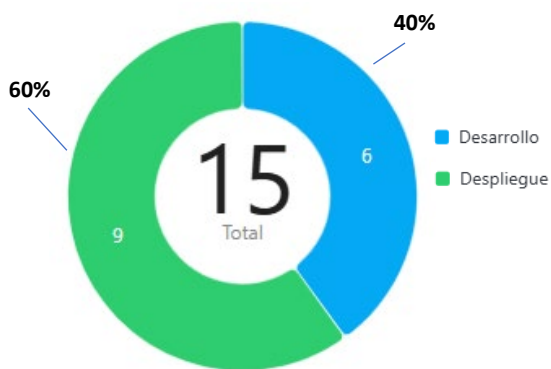


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General

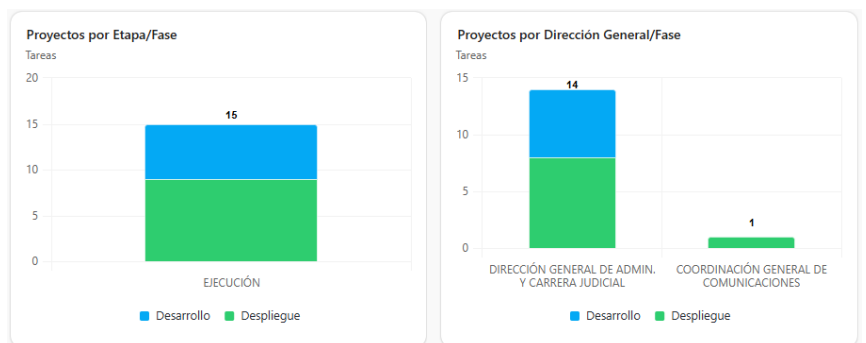


Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2026


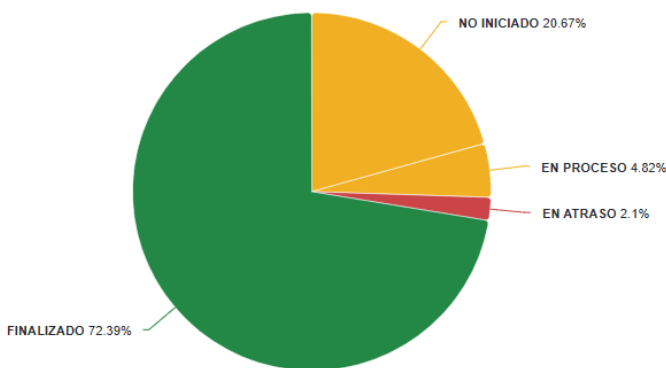


Gráfico No. 4: Estado de tareas de proyectos planificadas para el 2026

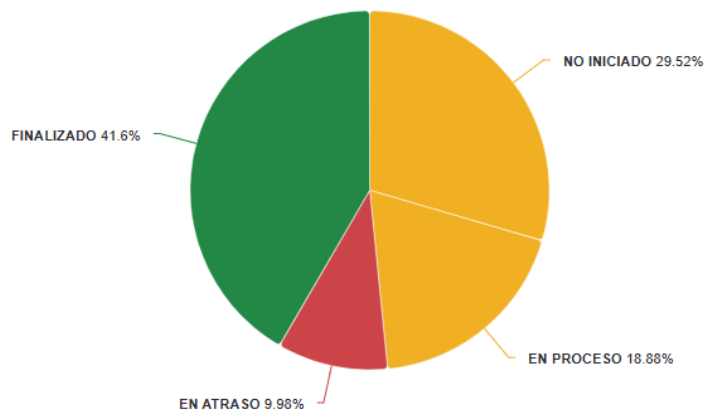

Al cierre del primer trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general se presenta un avance del portafolio 2026 de un **72.39%**. Este avance corresponde a un progreso acumulado de los proyectos en ejecución en función de su ciclo de vida, incluyendo aquellos que iniciaron en años anteriores. En cuanto a las actividades específicas programadas a finalizar en el 2026, se reporta un avance del **41.60%**, al cierre del 31 de marzo del 2026.


**Gráfico No. 5: Avance de Proyectos y Fase en la que se encuentra**

Nombre	Fase del proyecto	Progreso
Optimización Penal 0% Mora	Despliegue	242/279
Optimización del Proceso Inmobiliario 0% Mora > Optimización Inmobiliaria	Desarrollo	54/307
Modelo Operativo y Sistema de Calidad 0% Mora	Despliegue	328/370
Optimización de Notificaciones Judiciales 0% Mora	Desarrollo	5/43
Transformación Digital 0% Mora	Despliegue	224/236
ERP: Sistema de Gestión de Recursos 0% Mora	Despliegue	130/203
Evaluación del Desempeño 0% Mora	Desarrollo	91/121
Fortalecimiento Integral de la Atención de Usuarios(as) 100% Acceso	Desarrollo	62/400
Adecuación de Infraestructura Digna y Accesible 100% Acceso	Despliegue	430/597
Modelo de Ciudad Judicial 100% Acceso	Despliegue	819/888
Identidad Institucional y Portales Web 100% Acceso	Despliegue	206/216
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos 100% Acceso	Despliegue	297/414
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 100% Acceso	Despliegue	122/168
Justicia Juvenil Restaurativa 100% Acceso	Desarrollo	29/65
Justicia Abierta 100% Transparencia	Desarrollo	202/271


**Avance de proyectos según su vinculación estratégica:**

Dando cumplimiento al alineamiento estratégico que debe tener cada proyecto y en base al nuevo Plan Estratégico Institucional: “Justicia del Futuro 2034”, se tienen vinculados al eje de **0% Mora** un total de 7 proyectos: Optimización Penal, Optimización del Proceso Inmobiliario, Optimización de Notificaciones Judiciales, Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad; ERP: Implementación Sistema de Gestión de Recursos, Sistema de Evaluación del Desempeño y Transformación Digital [Programa-4 proyectos]. Al eje del **100% Acceso** se alinean 7 proyectos: Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios, Modelo de Ciudad Judicial, Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible, Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web, Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos; Justicia Juvenil Restaurativa y Tratamiento Bajo Supervisión Judicial. Al eje de **100% Transparencia** 1 proyecto: Justicia Abierta.


**Gráfico No. 6: Proyectos 2026/Eje Estratégico**

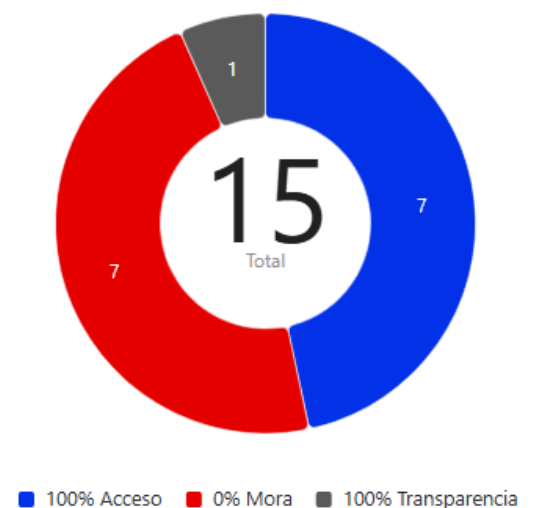

## Gráfico No. 7: Avance Proyectos 2026/Eje Estratégico

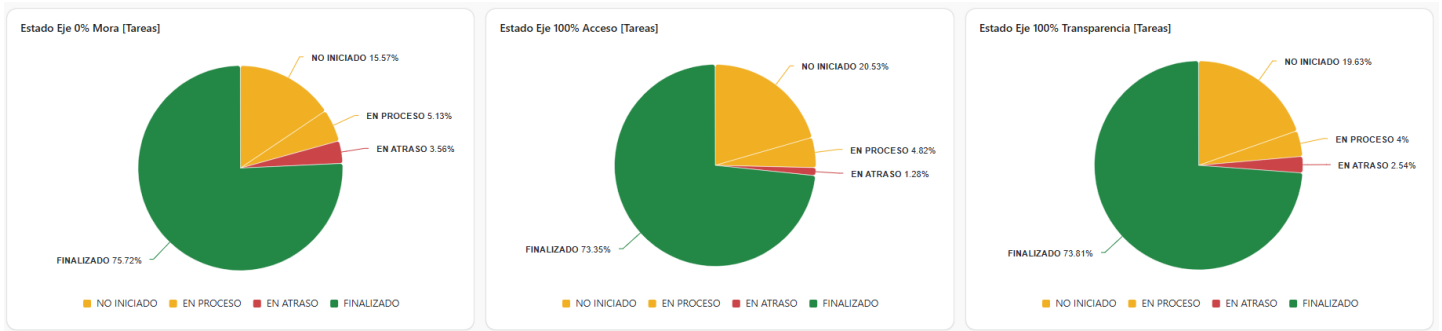

## Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2026/Objetivo Estratégico

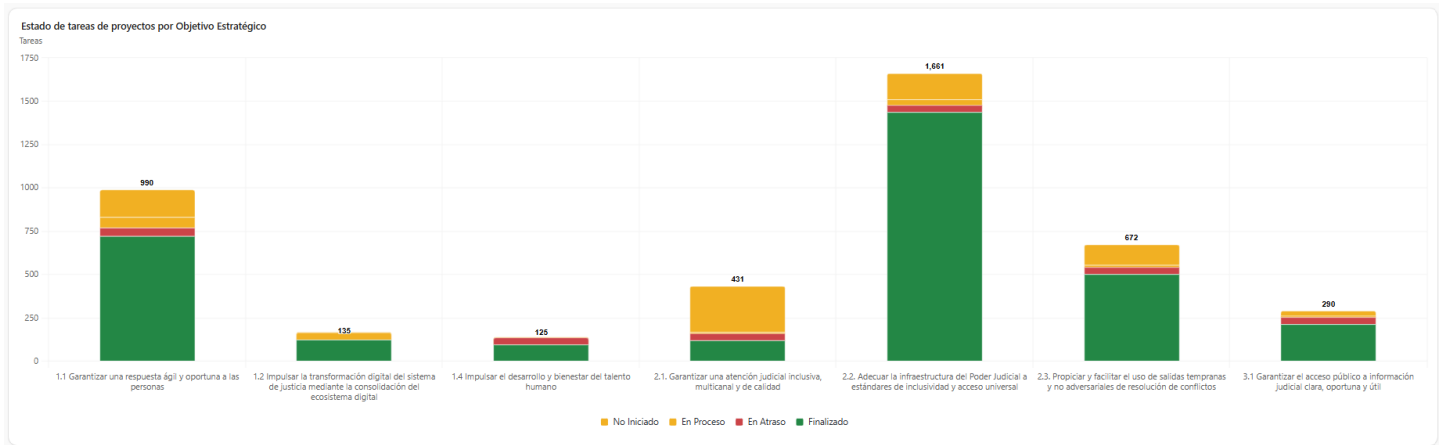

## Estatus de Hitos y Entregables 2026 por Proyecto, al 31 de marzo:

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable
<b>Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible</b> 3				
Desvelación Tarja en el Palacio de Justicia de El Seibo 5 (100% acceso)	Entregable	60%	29/5/26	Dirección de Infraestructura Física
Adecuación y remozamiento de 5 sedes judiciales a nivel nacional 5	Entregable	0%	15/12/26	Dirección de Infraestructura Física
Construcción del Juzgado de Paz de Cabral 9	Hito	67%	28/12/26	Dirección de Infraestructura Física
<b>ERP: Sistema de Gestión de Recursos (ERP)</b> 4				
ERP Módulo 3: Planificación 13	Entregable	100%	13/2/26	Dirección Financiera
ERP Módulo 2b: Procesos Administrativos Operando en el Sistema de Gestión de Recursos (ERP) 16 (0% mora)	Entregable	88%	1/5/26	Dirección Financiera
ERP Módulo 2a: Procesos financieros operando en el sistema de gestión de recursos (ERP) 21 (0% mora)	Entregable	67%	29/5/26	Dirección Financiera
ERP: Módulos ENJ y RI operando en el sistema de gestión de recursos (ERP) 24 (0% mora)	Entregable	17%	30/9/26	Dirección Financiera
<b>Fortalecimiento Integral Atención a Usuarios(as)</b> 7				
Oficina de Servicios Judiciales habilitada en el CENARVE (Centro Nacional de Retención de Vehículos) 5 (100% acceso)	Hito	40%	30/4/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Mensajería Informativa a Usuarios (WhatsApp y SMS) implementada 5 (100% acceso)	Hito	0%	30/6/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento en un X% el uso del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial (tramitación Digital)	Entregable	0%	15/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Formación y Asistencia Digital habilitada en 5 sedes judiciales 5	Entregable	0%	15/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Formación y Asistencia Digital habilitada en 5 sedes judiciales	Entregable	17%	15/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Espacio de Formación y Asistencia Digital - Ciudad Nueva (DN) 23	Entregable	17%	15/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento en un X% el uso del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial (tramitación Digital)	Entregable	20%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento de usuarios registrados en el portal Acceso Digital en un 20% 5	Entregable	20%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento en un X% el uso del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial (tramitación Digital) 6 (100% acceso)	Hito	0%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Modelo de experiencia del usuario judicial en Ciudad Judicial SDE actualizado 1 (100% acceso)	Entregable	0%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones

Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web 1

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
Programa en vivo: Justicia a un solo clic 6	Entregable	100%	22/1/26	Dirección de Producción e Identidad

+ Agregar Tarea

Justicia Abierta 9

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
Indicadores Estratégicos del PJ Centrados en las Personas publicados 7	Entregable	71%	10/4/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Validación del Registro de Notarios de la República Dominicana 8	Entregable	63%	15/5/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Plan de Justicia Abierta publicado 10 <b>100% transparencia</b>	Hito	40%	31/7/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Política de Justicia Abierta publicada 8	Entregable	25%	31/7/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Diagnóstico integral del sistema judicial – Jupiter/Banco Mundial publicado 13	Entregable	54%	30/9/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Métrica de Justicia Abierta del PJ publicada 16 <b>100% transparencia</b>	Hito	63%	30/10/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Diagnóstico del Sistema de Justicia OCDE – Justice Policy Review- publicado 6	Entregable	0%	1/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Acuerdo de Interconexión de datos estadísticos 5	Entregable	0%	11/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Plataforma de denuncias digitales de jueces y servidores 6	Entregable	0%	18/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas

+ Agregar Tarea

Justicia Juvenil Restaurativa 2

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
Programa Justicia Juvenil Restaurativa implementado en Santiago 7 <b>100% acceso</b>	Hito	14%	10/11/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Programa Justicia Juvenil Restaurativa implementado en Santo Domingo 7 <b>100% acceso</b>	Hito	14%	10/11/26	Dirección de Justicia Inclusiva

Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos 5

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
Centro de Mediación Judicial habilitado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís 10 <b>100% acceso</b>	Hito	70%	5/6/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Registro Inmobiliario de Higüey 10 <b>100% acceso</b>	Hito	60%	7/10/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Ampliación de la matrícula de mediadores de Poder Judicial [de 16 a 28 mediadores] 4 <b>100% acceso</b>	Entregable	25%	5/11/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Palacio de Justicia de Higüey 8 <b>100% acceso</b>	Hito	38%	5/11/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Centro de Mediación Judicial habilitado en el Palacio de Justicia de San Cristóbal 10 <b>100% acceso</b>	Hito	0%	1/12/26	Dirección de Justicia Inclusiva

Modelo de Ciudad Judicial 3

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
100 Tribunales de Santo Domingo Este operando en la Ciudad Judicial de SDE 13 <b>100% acceso hito</b>	Hito	100%	19/2/26	Dirección de Infraestructura Física
Recepción de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste <b>100% acceso</b>	Hito	0%	30/12/26	Dirección de Infraestructura Física
Diseño Conceptual de la Ciudad Judicial del Distrito Nacional, recibido 4 <b>100% acceso</b>	Entregable	0%	30/12/26	Dirección de Infraestructura Física

+ Agregar Tarea

Modelo Operativo y Sistema Integral de Calidad 4

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
Gabinete Técnico en la Primera Sala de la SCJ implementado al 100% 16	Entregable	88%	31/3/26	Secretaría General de la Suprema (SCJ)
Edición Piloto de Certificación de Calidad en la Justicia 6 <b>0% mora</b>	Entregable	100%	10/4/26	Dirección de Planificación y Desarrollo
Modelo Operativo Suprema Corte de Justicia elaborado 4 <b>0% mora</b>	Entregable	25%	29/5/26	Dirección de Planificación y Desarrollo
Tribunales a nivel nacional medidos en el 100% de estándares definidos para la Certificación de Calidad en la Justicia 6 <b>0% mora</b>	Hito	0%	13/11/26	Dirección de Planificación y Desarrollo

Transformación Digital 5

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha limite ↑	Área Responsable.
Puesta en operación y lanzamiento del Portal de Servicios Digitales del Poder Judicial: justicia.gov.do Lanzamiento de la versión 3.0 del Portal de Acceso Digital 8	Entregable	100%	22/1/26	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Puesta en operación y lanzamiento del Portal de Servicios Digitales del Poder Judicial: justicia.gov.do 11 <b>100% acceso</b>	Hito	100%	22/1/26	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Consultas públicas habilitadas para ciudadanos(as) a través de APIs [Interconexión de sistemas de entidades públicas] 4 <b>100% acceso 100% transparencia</b>	Hito	100%	11/2/26	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Optimización de procesos con Inteligencia Artificial implementada en SGC y Portal de Acceso Digital 10 <b>0% mora</b>	Hito	100%	29/6/26	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
30% de los salones de audiencia a nivel nacional habilitados para audiencias virtuales e híbridas [15 salones adicionales] 16 <b>100% acceso</b>	Hito	75%	27/10/26	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación

Optimización de Notificaciones Judiciales 1

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite ↑	Área Responsable.
<p>Reducidas en un 55% la cantidad audiencias aplazadas por falta de Citación, en la Jurisdicción Penal de Santo Domingo Este [de 11% a 5%] <span>0% mora</span></p>	Hito	25%	18/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones

Optimización Procesal Penal 6

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite ↑	Área Responsable.
<p>Tableros automatizados de ordenes de libertad y datos de salud de privados de libertad</p> <p>Optimización del flujo de la materia Penal en SGC en función de los nuevos Códigos y Reglamento Ejecución de la Pena <span>0% mora</span></p>	Entregable	25%	30/9/26	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
<p>Modelo Interinstitucional de Gestión Penal y Uso Racional de Acuerdos implementado en tres (3) Centros Privativos de Libertad <span>0% mora</span></p>	Hito	40%	4/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
<p>Trámites de la materia Penal gestionados vía Portal Digital mayor o igual a un 15% <span>100% acceso</span></p>	Hito	0%	30/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
<p>100% de las intimaciones realizadas dentro del plazo [materia Penal]</p>	Entregable	0%	30/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
<p>100% de las decisiones de audiencia de extinción emitidas una vez vencido el plazo del acto de intimación, cuando no se haya presentado el acto conclusivo [materia Penal]</p>	Entregable	0%	30/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
<p>Unidad Multidisciplinaria de Apoyo a la Justicia (UMAJ) - Fase 1 implementada [un servicio] <span>0% mora</span></p>	Hito	30%	30/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Optimización del Proceso Inmobiliario 9

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite ↑	Área Responsable.
<p>80% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional <span>0% mora</span></p>	Hito	0%	31/3/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
<p>Reducido el tiempo entre aplazamientos a no más de 30 días calendario para los deslindes y no más de 60 días para el resto de los casos [Materia Inmobiliaria] <span>0% mora</span></p>	Hito	0%	30/6/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
<p>Reducido el porcentaje promedio de aplazamientos de audiencias a un máximo del 45% <span>0% mora</span></p>	Entregable	22%	30/6/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
<p>Tasa de solución de asuntos contenciosos en materia Inmobiliaria mayor o igual 100% <span>0% mora</span></p>	Hito	22%	30/6/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
<p>Informaciones de procesos para el seguimiento de Tribunales Inmobiliarios, publicadas en el Observatorio del Poder Judicial <span>100% transparencia</span></p>	Entregable	38%	30/6/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
<p>Incrementado en un 30% el uso de la Regularización Parcelaria en Mensuras Catastrales como vía alternativa al Deslinde <span>0% mora</span></p>	Hito	0%	30/6/26	Registro Inmobiliario
<p>Tasa de solución de asuntos secretariales en Materia Inmobiliaria mayor o igual a un 100% <span>0% mora</span></p>	Hito	22%	30/9/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
<p>Reducido el tiempo promedio de espera para la primera audiencia a un máximo de 60 días para procesos de saneamiento, a 30 días o menos para casos de deslinde y para las litis sobre derechos registrados a 45 días o menos <span>0% mora</span></p>	Hito	0%	30/9/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
<p>Trámites de la materia Inmobiliaria gestionados vía Portal de Acceso Digital mayor o igual a un 35% <span>100% acceso</span></p>	Hito	22%	30/9/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño 1

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite ↑	Área Responsable.
<p>Política de Evaluación Desempeño Administrativa aprobada <span>0% mora</span></p>	Entregable	83%	1/5/26	Dirección de Gestión Humana

+ Agregar Tarea

Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 3

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite ↑	Área Responsable.
<p>Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en Santo Domingo <span>100% acceso</span></p>	Hito	85%	30/4/26	Dirección de Justicia Inclusiva
<p>Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en San Cristóbal <span>100% acceso</span></p>	Hito	85%	5/6/26	Dirección de Justicia Inclusiva
<p>Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado Distrito Nacional <span>100% acceso</span></p>	Hito	86%	5/6/26	Dirección de Justicia Inclusiva

## Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2026 (Recursos internos).

A continuación, se presentan las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2026, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 31 de marzo de 2026. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

### Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2026

Proyecto	Presupuesto RD\$	Pagado RD\$	Comprometido RD\$	Disponible RD\$
Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	\$66,156,194.42	\$0.00	\$32,331,678.52	\$33,824,515.90
Transformación Digital	\$57,167,968.02	\$0.00	\$28,920,400.00	\$28,247,568.02
Modelo de Ciudad Judicial	\$33,431,500.00	\$0.00	\$1,889,087.70	\$31,542,412.30
Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	\$6,129,080.00	\$0.00	\$88,264.00	\$6,040,816.00
Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad	\$4,676,360.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676,360.00
Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios(as)	\$4,651,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651,700.00
Optimización Procesal Penal	\$3,069,100.36	\$0.00	\$0.00	\$3,069,100.36
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	\$2,764,248.50	\$0.00	\$0.00	\$2,764,248.50
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	\$575,090.00	\$0.00	\$0.00	\$575,090.00
Justicia Juvenil Restaurativa	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Justicia Abierta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Optimización de Notificaciones Judiciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Optimización del Proceso Inmobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistema de Evaluación del Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total general</b>	<b>\$178,821,241.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,229,430.22</b>	<b>\$115,591,811.08</b>


*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 09/04/2026.*

*Nota: Aquellos proyectos que no tienen asignación presupuestaria para este año, se están ejecutando con capacidad operativa interna, sin la necesidad de recursos adicionales.*

**Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos 2026**



**Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria de proyectos al 31/03/2026**

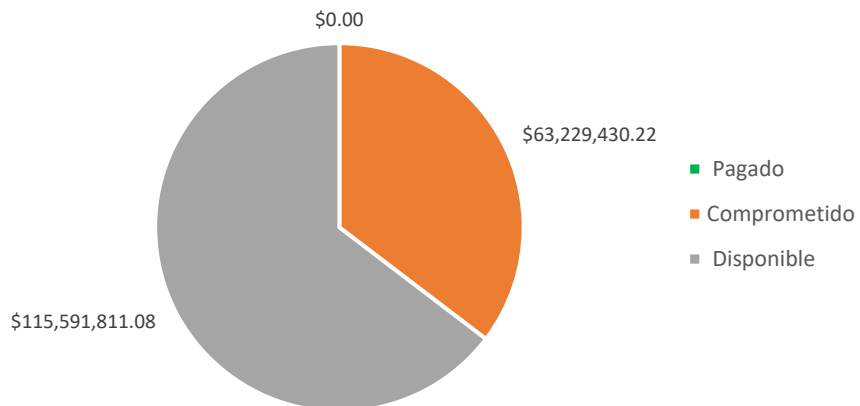

Elaborado:  
**Esperanza Adames L.**  
Gerente de Proyectos

Visto:  
**Isnelda Guzmán**  
Directora de Planificación y Desarrollo
