ID		Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Finish
0			0	**REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA SAMANA**	**108 days**	**Wed 10/13/21**
1			1	**REMOZAMIENTO PALACIO SAMANA**	**108 days**	**Wed 10/13/21**
2			1.1	Planificación preliminar (CONTRATISTA)	3 days	Wed 5/19/21
3			1.2	Suministro de materales	30 days	Wed 6/30/21
4			1.3	**Ejecución de Obra**	**103 days**	**Mon 10/11/21**
5			1.3.1	Baños privados 101-102	20 days	Wed 6/16/21
6			1.3.5	Baños privados 103-104	20 days	Wed 6/16/21
7			1.3.3	Baños privados 201-202	20 days	Wed 7/14/21
8			1.3.4	Rampa sala de entrevista	20 days	Wed 8/11/21
9			1.3.5	Rampa entrada principal	18 days	Mon 9/6/21
10			1.3.6	Parqueo para personas discapasitadas	15 days	Wed 8/4/21
11			1.3.7	Centro de entrevista	3 days	Mon 8/9/21
12			1.3.8	Sala de lactancia	15 days	Mon 8/30/21
13			1.3.9	Miscelaneos	25 days	Mon 10/11/21
14			1.4	**Recepción final de obra**	**2 days**	**Wed 10/13/21**
15			1.5	**Finalización de obra**	**0 days**	**Wed 10/13/21**

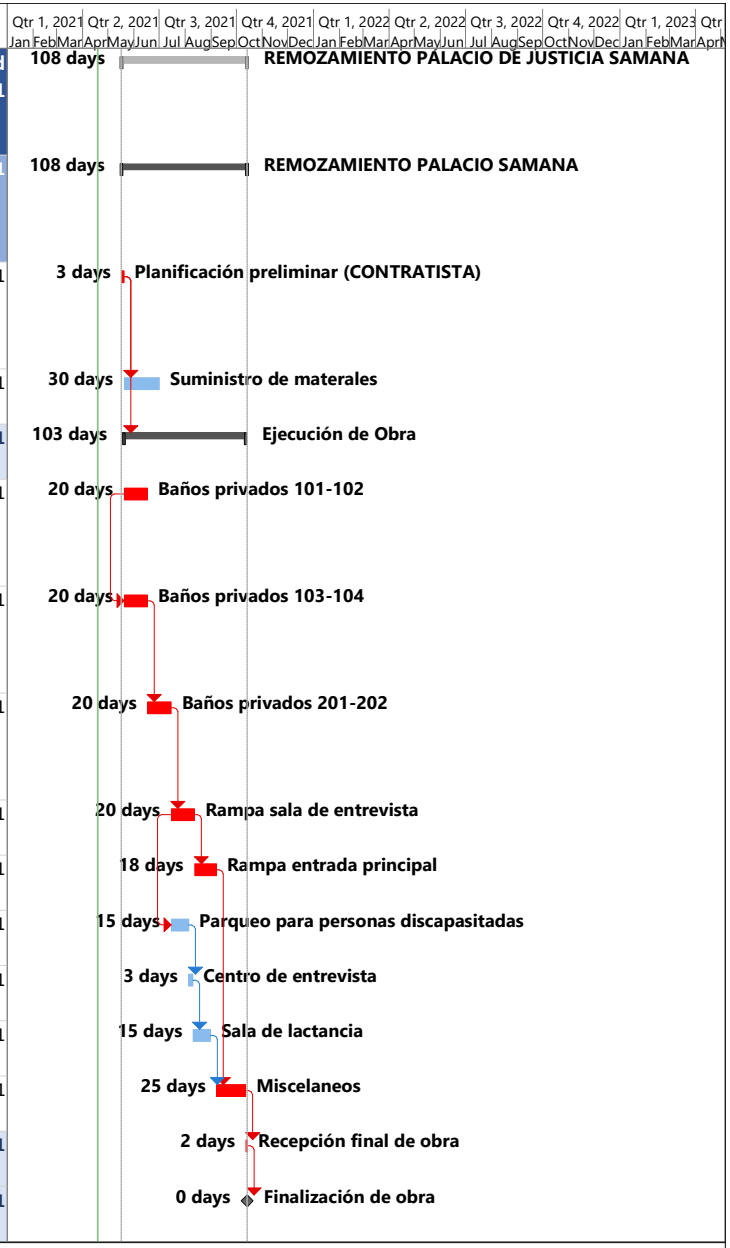

Proyecto: REMOZAMIENTO PA
Fecha: Mon 4/19/21

Task	Project Summary	Rolled Up Progress	Inactive Summary	Start-only
Task Progress	Group By Summary	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	Rolled Up Task	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Rolled Up Critical Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Critical Task
Summary	Rolled Up Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary	Critical Task Progress
