Informe de Avance de Proyectos del POA 2025

Cierre del segundo trimestre - al 30/06/2025

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Planificación y Desarrollo

Julio 10, 2025

Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial, a través de la Dirección de Planificación, elabora anualmente el Plan Operativo Anual (POA), un instrumento clave para orientar las acciones y proyectos de la institución. Este proceso de planificación se lleva a cabo con la participación de las distintas áreas del Poder Judicial, permitiendo una visión integral de las necesidades y prioridades institucionales. El POA se somete a la revisión y aprobación del Consejo del Poder Judicial (CPJ), asegurando la alineación con la visión estratégica de la institución, cuyo enfoque se sustenta en tres pilares o ejes fundamentales: **0% Mora, 100% Acceso y 100% Transparencia**, los cuales guían la implementación de proyectos y la asignación de recursos. Estos pilares representan el compromiso de la institución con la mejora continua y sostenibilidad una la administración de justicia con calidad, buscando eliminar la mora judicial, eficientizar los procesos, garantizar un acceso equitativo y oportuno a la justicia para toda la ciudadanía y promover la transparencia en todos los niveles del sistema judicial.

La planificación de los proyectos para el año 2025 se basa en estos ejes estratégicos, teniendo como máxima el **"Poner en el centro a las personas"**, buscando garantizar su dignidad con un servicio de justicia eficiente y oportuno. Otros elementos que destacar y que se encuentran contemplados dentro de esta planificación son en la modernización de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal judicial y administrativo, y la optimización de los procesos internos. Además, se busca fortalecer la colaboración interinstitucional para garantizar que las políticas del Poder Judicial estén alineadas con las necesidades sociales y las expectativas de la población. Este enfoque estratégico para 2025 no solo busca cumplir con los objetivos planteados, sino también crear un sistema judicial más eficiente, accesible y confiable, reflejando un compromiso firme con la justicia y el bienestar social.

El Plan Operativo Anual (POA) del Poder Judicial para el año 2025 se aprobó en el acta del Consejo del Poder Judicial núm. 39-2024, en su Sesión Ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2024, con un total de 19 proyectos. En función del alcance definido para el año 2025, se ha asignado a los proyectos estratégicos un presupuesto de RD$970,581,385.96, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución. Adicionalmente, fue incorporado el proyecto de Justicia Abierta con el objetivo de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información judicial. Este proyecto busca promover una gestión más accesible y comprensible, facilitando la interacción de la ciudadanía con el sistema judicial mediante el uso de tecnologías de la información. Además, la implementación de la Justicia Abierta fomenta la rendición de cuentas, mejora la confianza pública en las instituciones y promueve la eficiencia en la administración de justicia. Con esta inclusión se tiene un total de 20 proyectos como parte del portafolio del Poder Judicial.

En la actualidad se lleva a cabo un proceso de reordenamiento presupuestario que asegura la asignación eficiente de recursos en función de las prioridades estratégicas del Poder Judicial, alineándose con las buenas prácticas de las metodologías ágiles de gestión de proyectos, las cuales promueven la adaptabilidad en la gestión organizacional, tanto operativa como estratégica. En función de esto, al cierre del 30/06/2025, los proyectos estratégicos tienen un presupuesto total asignado de 879,213,184.90

Los proyectos definidos como prioritarios para este año 2025 son los siguientes:

1. **Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible**
2. **Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional**
3. **Apertura de la sede Santo Domingo Este**
4. **Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web**
5. **Implementación de la Política de Comunicaciones**
6. **Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)**
7. **Justicia Abierta**
8. **Justicia Juvenil Restaurativa**
9. **Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos**
10. **Modelo de Atención al Usuario**
11. **Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad**
12. **Optimización Procesal Penal**
13. **Planificación Estratégica Decenal**
14. **Sistema de Evaluación del Desempeño**
15. **Tribunales al día**
16. **Tratamiento Bajo Supervisión Judicial**

Transformación Digital, conformado por:

17. Sistema de Gestión de Casos
18. Acceso Digital y Audiencias Virtuales
19. Interoperabilidad
20. Inteligencia Artificial y Robotización

Como parte del seguimiento realizado a estos proyectos, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio, así como el porcentaje de avance general, siendo un 59.43%, al corte del 30 de junio del del 2025.

Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2025, al cierre del segundo trimestre.

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 30 de junio, 16 proyectos se encuentran en etapa de ejecución y 1 fue cerrado en el mes de mayo 2025, el cual corresponde al proyecto de "Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional". En cuanto a las fases específicas, se tienen 9 proyectos en fase de despliegue (58%) (incluido aquí el programa de Transformación Digital, el cual incluye 4 proyectos descritos previamente), 6 en fase de desarrollo (32%), 1 en fase de piloto (5%) y 1 en fase de cierre (5%). A continuación, se presentan las gráficas y tablas correspondientes a la distribución por etapas y fases, además del estatus del portafolio en sentido general:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase

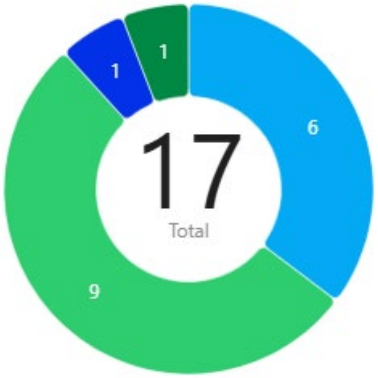

Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General

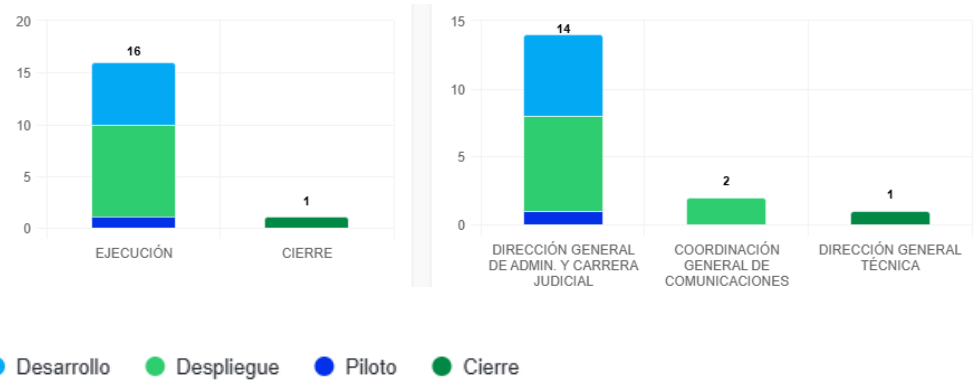

Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2025

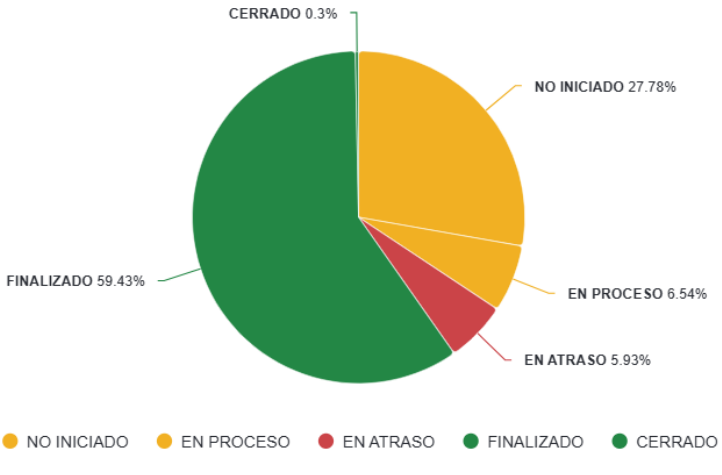

Gráfico No. 4: Progreso y tareas con fecha límite/fecha fin vencida

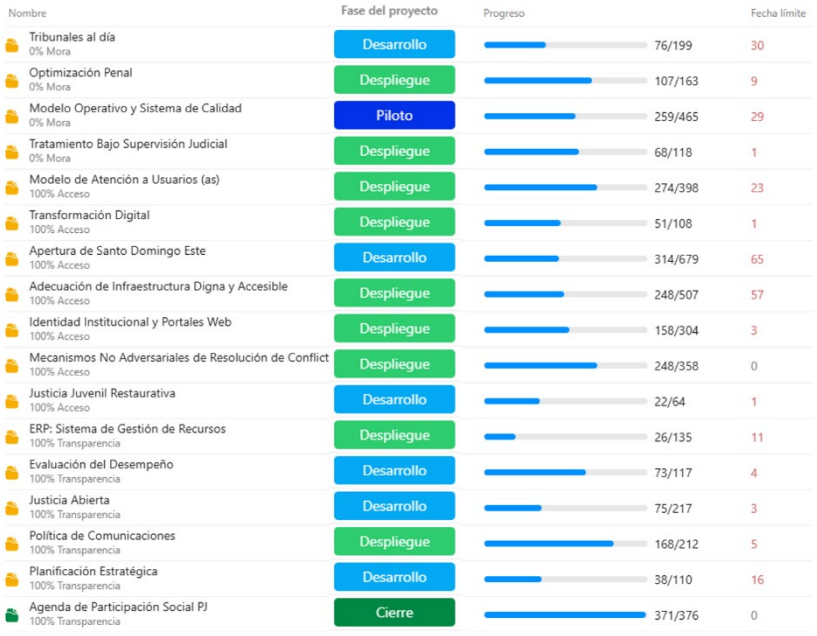

Nombre	Fase del proyecto	Progreso		Fecha límite
Tribunales al día 0% Mora	Desarrollo		76/199	30
Optimización Penal 0% Mora	Despliegue		107/163	9
Modelo Operativo y Sistema de Calidad 0% Mora	Piloto		259/465	29
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 0% Mora	Despliegue		68/118	1
Modelo de Atención a Usuarios (as) 100% Acceso	Despliegue		274/398	23
Transformación Digital 100% Acceso	Despliegue		51/108	1
Apertura de Santo Domingo Este 100% Acceso	Desarrollo		314/679	65
Adecuación de Infraestructura Digna y Accesible 100% Acceso	Despliegue		248/507	57
Identidad Institucional y Portales Web 100% Acceso	Despliegue		158/304	3
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflict 100% Acceso	Despliegue		248/358	0
Justicia Juvenil Restaurativa 100% Acceso	Desarrollo		22/64	1
ERP: Sistema de Gestión de Recursos 100% Transparencia	Despliegue		26/135	11
Evaluación del Desempeño 100% Transparencia	Desarrollo		73/117	4
Justicia Abierta 100% Transparencia	Desarrollo		75/217	3
Política de Comunicaciones 100% Transparencia	Despliegue		168/212	5
Planificación Estratégica 100% Transparencia	Desarrollo		38/110	16
Agenda de Participación Social PJ 100% Transparencia	Cierre		371/376	0

Al cierre del segundo trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 59.43%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 30 de junio 2025:

Avance de proyectos según su vinculación estratégica:

Dando cumplimiento al alineamiento estratégico que debe tener cada proyecto, se tienen vinculados al eje de **0% Mora** un total de 4 proyectos: Tribunales al día, Optimización Penal, Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad; y Tratamiento Bajo Supervisión Judicial. Al Eje del **100% Acceso** se alinean 7 proyectos: Modelo de Atención a Usuarios(as), Transformación Digital [Programa], Apertura de Sede Judicial SDE, Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible, Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web, Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos; y Justicia Juvenil Restaurativa. Al eje de **100% Transparencia** 6 proyectos: ERP: Implementación Sistema de Gestión de Recursos, Sistema de Evaluación del Desempeño, Justicia Abierta, Política de Comunicaciones, Planificación Estratégica Decenal; y Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional.

Gráfico No. 5: Proyectos 2025/Eje Estratégico

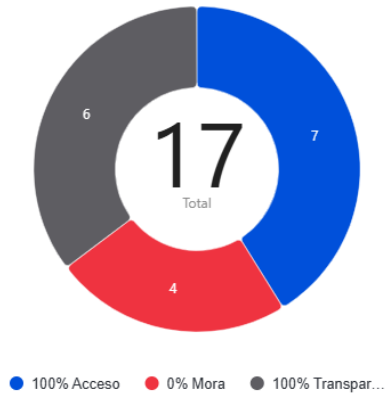

Gráfico No. 6: Avance Proyectos 2025/Eje Estratégico

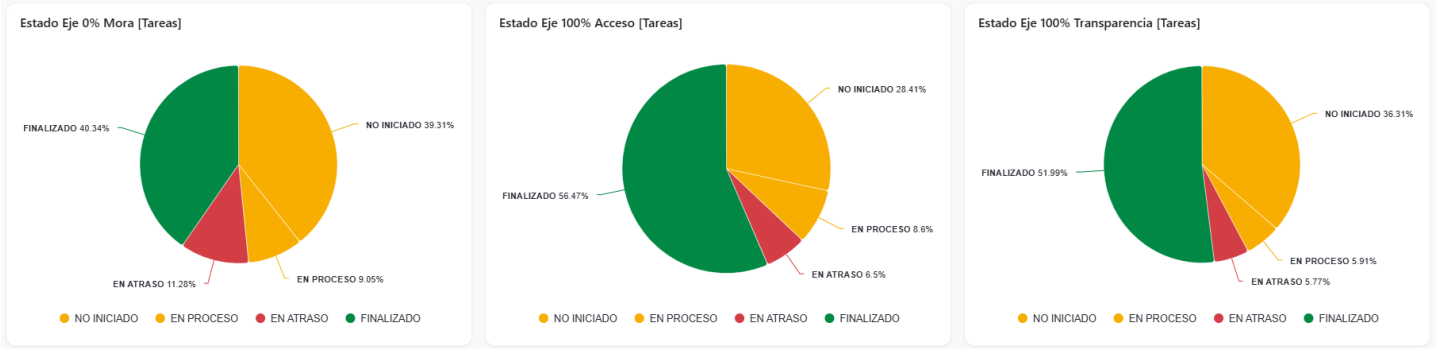

Gráfico No. 7: Estado de Tareas de Proyectos/Objetivo Estratégico

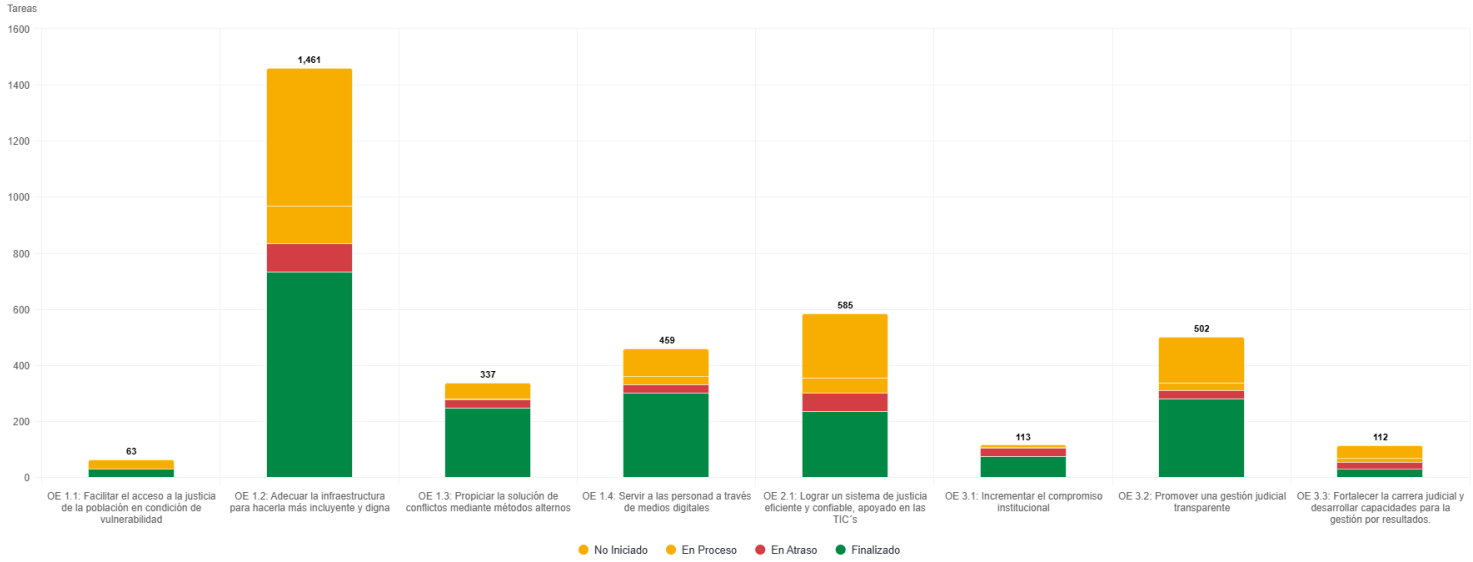

Estatus de Hitos 2025 por Proyecto, al 30 de junio:

Adecuación de sedes para Infraestructura D... 7

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO - Readecuación de 18 sedes para Infraestructura digna y accesible [T1] 20 100% acceso	90%	16 jun.	Dirección de Infraestructura Física
HITO - Readecuación de 4 sedes para Infraestructura digna y accesible [T2] 5 100% acceso	40%	16 jul.	Dirección de Infraestructura Física
HITO - Readecuación de 9 sedes para Infraestructura digna y accesible [T3] HITO-Desvelación Tarja en el Palacio de Justicia de El Seibo 5 100% acceso	0%	5 ago.	Dirección de Infraestructura Física
HITO - Readecuación de 9 sedes para Infraestructura digna y accesible [T3] 10 100% acceso	0%	22 oct.	Dirección de Infraestructura Física
HITO - Centro de Servicios Secretariales de la SCJ habilitado [Infraestructura física] 11 100% acceso	36%	26 nov.	Dirección de Infraestructura Física
HITO - Readecuación de 28 las salas de audiencias del Palacio de Justicia de Santiago 9 100% acceso	67%	16 dic.	Dirección de Infraestructura Física
HITO - Readecuación de 9 sedes para Infraestructura digna y accesible [T4] 11 100% acceso	9%	10/3/26	Dirección de Infraestructura Física

Agenda de Participación Social PJ Nacional ... 2

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Cumbre Judicial Iberoamericana 9 100% transpar...	100%	19 may.	Dirección de Relaciones Internac...
HITO-Cumbre Judicial Iberoamericana HITO-Estrategia de Comunicación Cumbre Judicial Iberoamericana 13 100% transpar...	100%	19 may.	Dirección de Comunicación Estr...

Apertura de Sede Judicial SDE 2

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-100% Tribunales Civiles y Centro de Servicio Secretarial operando en Ciudad Judicial San... 9 100% acceso	33%	31 oct.	Dirección de Infraestructura Física
HITO-100% Tribunales de Santo Domingo Este, Centro de Mediación y Centros de Servicios Co... 5 100% acceso	0%	18/2/26	Dirección de Infraestructura Física

ERP: Sistema de Gestión de Recursos (ERP) 4

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-ERP Módulo 1: Servicios de gestión humana operando en el sistema de gestión de re... 16 100% transpar...	63%	24 jun.	Dirección Financiera
HITO-ERP Módulo 3: Procesos administrativos operando en el sistema de gestión de recur... 16 100% transpar...	6%	18 jul.	Dirección Financiera
HITO-ERP Módulo 2: Procesos financieros operando en el sistema de gestión de recursos (... 17 100% transpar...	65%	17 sep.	Dirección Financiera
HITO-ERP Módulos ENJ y RI operando en el sistema de gestión de recursos (ERP) 17 100% transpar...	0%	29 oct.	Dirección Financiera

Justicia Abierta 8

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-100% Estadísticas de los tribunales publicadas en el Observatorio del PJ 3 100% transpar...	100%	7 feb.	Dirección de Análisis y Políticas ...
HITO-Política de Protección de Datos socializada 6 100% transpar...	33%	27 jun.	Secretaría General de la Suprem...
HITO-Política de datos abiertos publicada 11 100% transpar...	36%	28 jul.	Dirección de Análisis y Políticas ...
HITO-Conferencia Internacional de Justicia Abierta 8 100% transpar...	0%	29 ago.	Dirección de Relaciones Internac...
HITO-Publicación y Socialización del índice de justicia abierta 4 100% transpar...	0%	30 sep.	Dirección de Análisis y Políticas ...
HITO-Plan de Justicia Abierta elaborado 8 100% transpar...	0%	31 oct.	Dirección de Análisis y Políticas ...
HITO-Memoria Institucional 2019-2025 elaborada 13 100% transpar...	15%	26 dic.	Dirección de Análisis y Políticas ...
HITO-Elaboración del Índice de justicia abierta 10 100% transpar...	70%	28/2/26	Dirección de Análisis y Políticas ...

Mecanismos No Adversariales de Resolució... 6

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Palacio de Justicia de Jarabacoa 7 100% acceso	43%	12 nov.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Registro Inmobiliario de Higüey 10 100% acceso	60%	12 nov.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Palacio de Justicia de Higüey 11 100% acceso	64%	27 nov.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Centro de Mediación Judicial habilitado en el Distrito Nacional 11 100% acceso	55%	1 dic.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Centro de Mediación Judicial habilitado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís 10 100% acceso	40%	26 dic.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Ampliación de la matrícula de mediadores de Poder Judicial [de 16 a 28 mediadores] 4 100% acceso	0%	26/3/26	Dirección de Justicia Inclusiva

Modelo de Atención a Usuario(as) 7

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devueltos] HITO-15 Sedes con devolución de documentos (30 sedes implementadas en total) 17 100% acceso	100%	30 jun.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devueltos] HITO-30 Sedes con devolución de documentos (45 sedes implementadas en total) 20 100% acceso	0%	30 sep.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devuelt... 2 100% acceso	50%	30 sep.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtuales: Cortes-DN, Ciudad Nueva, SDE, Santiago, La... HITO-Modelo de atención a usuarios(as) desplegado en Ciudad Judicial de Santo Doming... 13 100% acceso	0%	14 nov.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtuales: Cortes-DN, Ciudad Nueva, SDE, Santiago, La... HITO-Modelo de atención a usuarios(as) desplegado en Santiago (con devolución de docu... 11 100% acceso	0%	2 dic.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtuales: Cortes-DN, Ciudad Nueva, SDE, Santiago, La... HITO-Modelo de atención a usuarios(as) desplegado en Ciudad Nueva (DN) 12 100% acceso	0%	26 dic.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtual... 6 100% acceso	33%	30 dic.	Dirección de Servicio Judicial y ...

Modelo Operativo y Sistema Integral de Cal... 7

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Modelo Operativo Contencioso administrativa (TSA) 5 0% mora	20%	16 jul.	Dirección de Planificación y Des...
HITO-Gabinete Técnico en la Primera Sala de la SCJ implementado al 100% 18 0% mora	67%	29 jul.	Secretaría General de la Suprem...
HITO-Modelo Operativo Suprema Corte de Justicia 4 0% mora	0%	28 oct.	Dirección de Planificación y Des...
HITO-Gabinete Técnico en la Tercera Sala de la SCJ implementado al 100% 29 0% mora	10%	24 nov.	Secretaría General de la Suprem...
HITO-1ra Edición de Certificación de Calidad en la Justicia 10 0% mora	10%	24 nov.	Dirección de Planificación y Des...
HITO-Modelo operativo implementado en materia Civil y Comercial 1ra Instancia de La Altagracia 11 0% mora	27%	3/3/26	Dirección de Planificación y Des...
HITO-Gabinete Técnico en la Segunda Sala de la SCJ implementado al 100% 28 0% mora	4%	24/3/26	Secretaría General de la Suprem...

Optimización Procesal Penal 6

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-22 Operadores penales realizan pasantía en negociación en el Judicial Studies Institute en ... 5 0% mora	100%	6 feb.	Escuela Nacional de la Judicatura
HITO-Talleres regionales de negociación en 9 Dptos. Judiciales con expertos internacionales 10 0% mora	90%	31 jul.	Escuela Nacional de la Judicatura
HITO-Modificación de la Resolución 296-05 Tribunales de Ejecución de la Pena 13 0% mora	100%	28 ago.	Dirección General de Administra...
HITO-Intimaciones al día para la reducción de privados de libertad sin acto conclusivo 13 0% mora	54%	17 nov.	Dirección General de Administra...
HITO-Privados de libertad con pena cumplida con orden de libertad al día 11 0% mora	55%	25 nov.	Dirección General de Administra...
HITO-Implementación de Servicios de apoyo a la labor jurisdiccional en Ejecución de la Pena (1r... 10 0% mora	20%	18 dic.	Dirección General de Administra...

Planificación Estratégica Decenal 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO- Aprobación del Plan Estratégico Decenal 2025-2034 por el CPJ HITO-Escenarios del futuro de la Justicia formulados 2 100% transpar...	100%	2 abr.	Dirección de Planificación y Des...
HITO- Aprobación del Plan Estratégico Decenal 2025-2034 por el CPJ 7 100% transpar...	71%	16 may.	Dirección de Planificación y Des...
HITO-Lanzamiento de Plan Estratégico Decenal del PJ 2025-2034 17 100% transpar...	0%	30 sep.	Dirección de Planificación y Des...

Política de Comunicación del Poder Judicial 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Propuesta para Implementación de Laboratorio de Casos Mediáticos 3 100% transpar...	100%	30 jun.	Dirección de Comunicación Estr...
HITO-Protocolo de gestión comunicacional ante la crisis 9 100% transpar...	67%	16 jul.	Dirección de Comunicación Estr...
HITO-Protocolo de estilo de las comunicaciones del PJ aprobado 7 100% transpar...	14%	15 dic.	Dirección de Comunicación Estr...

Identidad Institucional & Accesibilidad-Usa... 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Ciudad Judicial de Santo Domingo Este con identidad institucional implementada (1ra et... 5 100% acceso	40%	24 oct.	Dirección de Producción e Ident...
HITO-Sede Central del Poder Judicial con identidad institucional implementada (1ra etapa) 6 100% transpar...	17%	15 dic.	Dirección de Producción e Ident...
HITO-Rediseño de nuevos portales Web 5 100% acceso	0%	25/2/26	Dirección de Producción e Ident...

Sistema de Evaluación del Desempeño 2

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Modelo de Indicadores de productividad (servidores jurisdiccionales) elaborado 6 100% transpar...	100%	11 feb.	Dirección de Planificación y Des...
HITO-Evaluación del desempeño de Juezas y Jueces del año 2024 11 0% mora	82%	30 jul.	Dirección de Gestión Humana

Transformación Digital 10

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Sistema de Gestión de Casos en Materia Penal HITO-100% Tribunales Penales con Sistema de Gestión de Casos implementado 100% acceso	100%	31 mar.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-100% Tribunales Laborales con Audiencias Virtuales habilitadas 100% acceso	100%	31 mar.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-100% Tribunales Laborales con Acceso Digital implementado 100% acceso	100%	31 mar.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-100% Juzgados de Paz actualizados con la última versión del Sistema de Gestión de Casos 100% acceso	100%	5 ago.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-Incrementar en 5 las Fiscalías la interoperabilidad con el Poder Judicial 7 0% mora	100%	20 nov.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-Implementar en 5 Defensorías la interoperabilidad con el Poder Judicial 6 0% mora	50%	20 nov.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-Duplicada la cantidad de usuarios(as) registrados(as) en el portal de Acceso Digital [Incr... 3 100% acceso	100%	10 dic.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-30 Salones de Audiencia habilitados para audiencias virtuales e híbridas [cubriendo el 2... 9 100% acceso	0%	30 dic.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-100% Tribunales Inmobiliarios con Audiencias Virtuales habilitadas 8 100% acceso	25%	30 dic.	Dirección de Tecnología de la In...
HITO-100% Tribunales Inmobiliarios con Acceso Digital implementado 8 100% acceso	50%	30 dic.	Dirección de Tecnología de la In...

Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado Distrito Nacional 10 0% mora	40%	15 sep.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en Santo Domingo 10 0% mora	40%	15 sep.	Dirección de Justicia Inclusiva
HITO-Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en San Cristóbal 10 0% mora	40%	29 sep.	Dirección de Justicia Inclusiva

Tribunales al día 21 ··· + Agregar Hito

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
HITO-75% de tribunales al día a nivel nacional 15 0% mora	100%	31 mar.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-75% de tribunales al día a nivel nacional HITO-51% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional 0% mora	100%	31 mar.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-75% de tribunales al día a nivel nacional HITO-67% de Tribunales Penales al día a nivel nacional 0% mora	100%	31 mar.	Dirección de Servicio Judicial y ...
HITO-Implementación de Inteligencia Artificial (IA) para apoyo en la elaboración de las decision... 8 0% mora	100%	30 abr.	Escuela Nacional de la Judicatura
HITO-Levantamiento de asuntos pendientes en salas priorizadas (50 salas) 7 0% mora	100%	13 jun.	Dirección de Servicio Judicial y ...

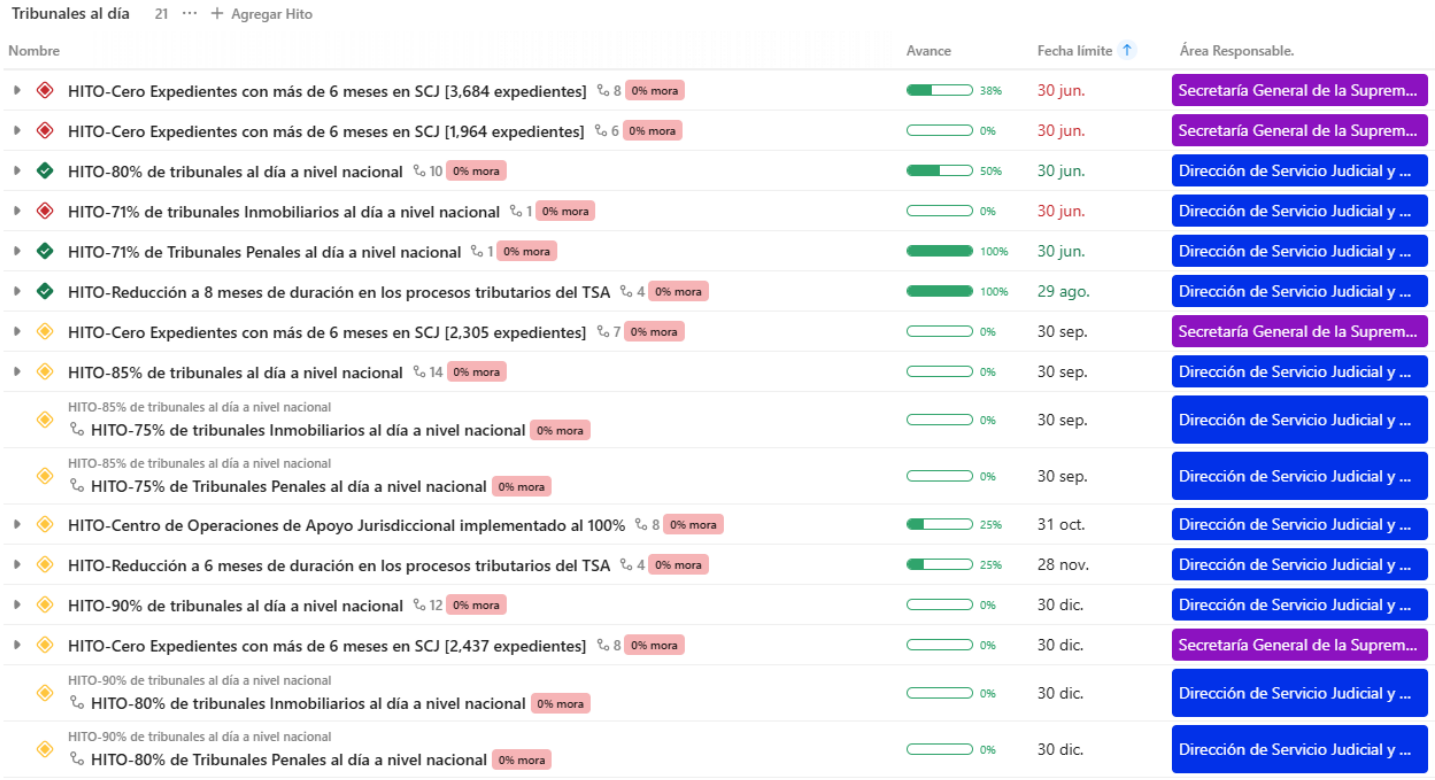

Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2025 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2025, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 30 de junio 2025. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2025

Proyecto	Presupuesto Asignado	Comprometido	Pagado	Disponible
Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	241,891,808.97	203,471,966.52	17,132,773.40	21,287,069.05
Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-
Apertura de Sede Judicial SDE	319,729,558.96	272,577,063.72	47,152,495.24	-
Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	29,242,574.14	7,622,706.50	-	21,619,867.64
Implementación de la Política de Comunicaciones del PJ	7,868,000.00	2,800,000.00	4,000,000.00	1,068,000.00
Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
Justicia Abierta	10,670,000.00	-	-	10,670,000.00
Justicia Juvenil Restaurativa	546,428.57	286,428.57	-	260,000.00
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	6,116,428.57	1,126,428.57	2,205,600.00	2,784,400.00
Modelo Atención a Usuarios(as)	6,354,000.00	3,950,000.00	184,800.00	2,219,200.00
Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad	9,247,211.12	-	6,123,400.00	3,123,811.12
Optimización Procesal Penal	35,250,000.00	-	27,000,000.00	8,250,000.00
Planificación Estratégica Decenal	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-
Sistema de Evaluación del Desempeño	2,800,000.00	-	39,150.00	2,760,850.00
Transformación Digital	142,407,290.72	39,819,455.24	84,567,326.98	18,020,508.50
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	240,000.00	-	-	240,000.00
Tribunales al día	3,849,883.85	1,703,638.00	87,000.00	2,059,245.85
Total general	**879,213,184.90**	**533,357,687.12**	**238,492,545.62**	**107,362,952.16**

**Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 09/07/2025.*

Gráfico No. 8: Distribución presupuestaria de los proyectos 2025

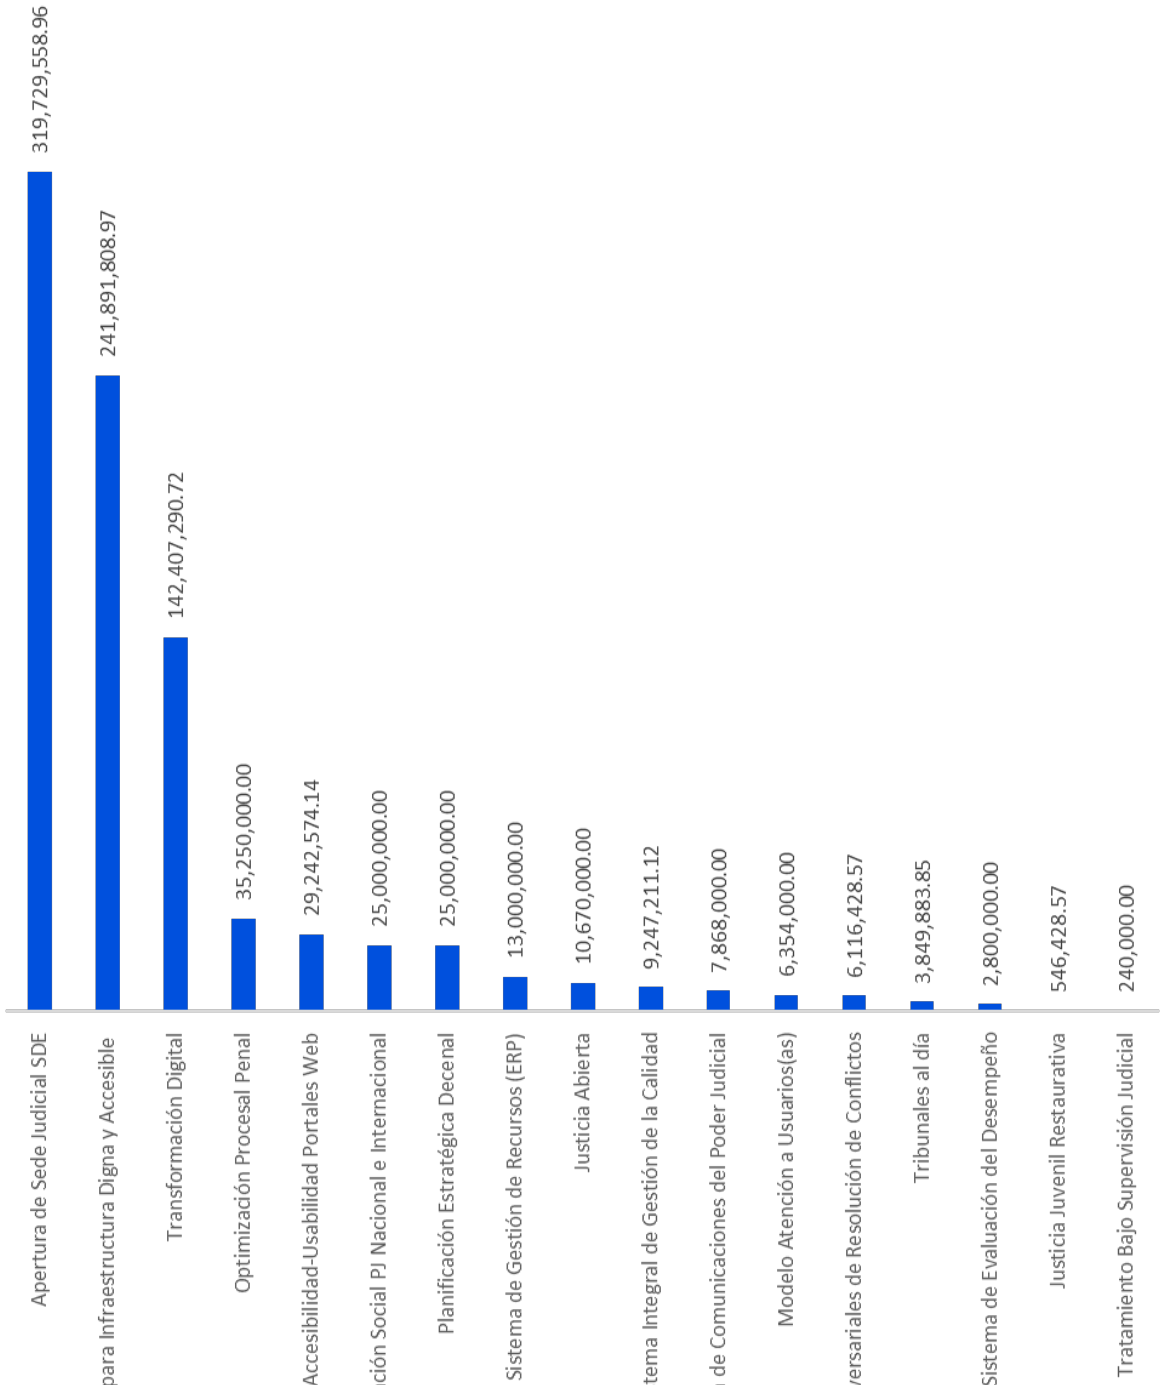

Gráfico No. 9: Ejecución Presupuestaria de proyectos al 30/06/2025

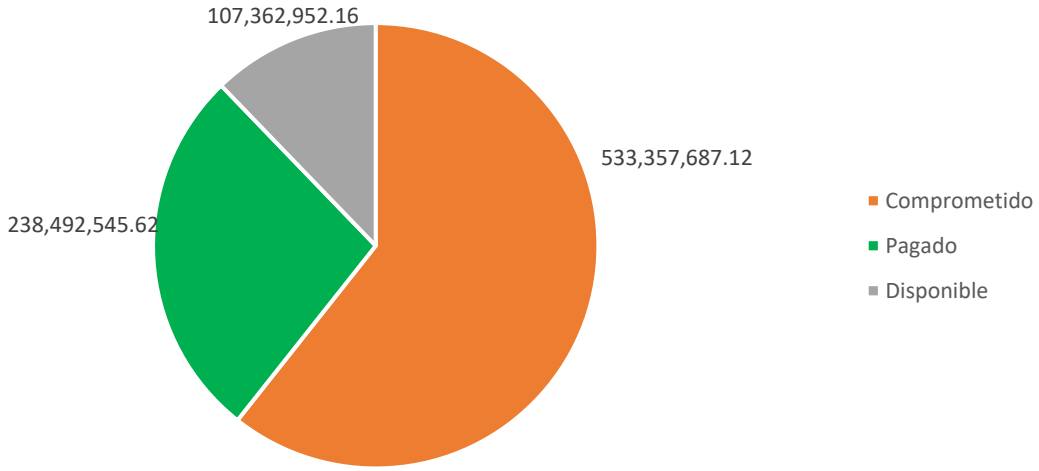

Elaborado:
Esperanza Adames L.
Gerente de Proyectos

Visto:
Isnelda Guzmán
Directora de Planificación y Desarrollo

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Esperanza Adames Liranzo
Isnelda R. Guzman De Jesus
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/8B87-XJJS-695R-88XU
