Informe de Avance de Proyectos del POA 2026

Cierre del tercer trimestre - al 30/09/2026

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Planificación y Desarrollo

Octubre 9, 2026

Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial, a través de su Dirección de Planificación y Desarrollo, elabora anualmente el Plan Operativo Anual (POA), un instrumento clave para orientar las acciones y proyectos de la institución. Este proceso de planificación se lleva a cabo con la participación de las distintas áreas del Poder Judicial, permitiendo una visión integral de las necesidades y prioridades institucionales. El POA se somete a la revisión y aprobación del Consejo del Poder Judicial (CPJ), asegurando la alineación con la visión estratégica de la institución y su plan decenal "**Justicia del Futuro 2034**", cuyo enfoque se sustenta en tres ejes estratégicos: **0% Mora**, **100% Acceso** y **100% Transparencia**, los cuales guían la implementación de proyectos y la asignación de recursos. Estos ejes representan el compromiso de la institución con la mejora continua y sostenibilidad en la administración de justicia con calidad, buscando eliminar la mora judicial, eficientizar los procesos, garantizar un acceso equitativo y oportuno a la justicia para toda la ciudadanía y promover la transparencia en todos los niveles del sistema judicial.

La planificación de los proyectos para el año 2026 se basa en estos tres ejes, teniendo como prioridad el **"Poner en el centro a las personas"**, buscando garantizar su dignidad con un servicio de justicia eficiente y oportuno. Otros elementos que destacar y que se encuentran contemplados dentro de esta planificación son en la modernización de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal judicial y administrativo, y la optimización de los procesos internos. Además, se busca fortalecer la colaboración interinstitucional para garantizar que las políticas del Poder Judicial estén alineadas con las necesidades sociales y las expectativas de la población. Este enfoque estratégico para el 2026 no solo busca cumplir con los objetivos planteados, sino también crear un sistema judicial más eficiente, accesible y confiable, reflejando un compromiso firme con la justicia y el bienestar social.

El Plan Operativo Anual (POA) del Poder Judicial para el año 2026 se aprobó en el acta del Consejo del Poder Judicial núm. 06-2026, en su Sesión Ordinaria celebrada el 3 de marzo de 2026, con un total de 18 proyectos, de los cuales 5 corresponden a nuevas incorporaciones y 13 que vienen ejecutándose de años anteriores. En función del alcance definido para el año 2026, se ha asignado a los proyectos estratégicos un presupuesto de RD$147,364,106.69, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución.

Cabe destacar que actualmente se lleva a cabo un proceso de reordenamiento presupuestario que asegura la asignación eficiente de recursos en función de las prioridades estratégicas del Poder Judicial, alineándose con las buenas prácticas de las metodologías ágiles de gestión de proyectos, las cuales promueven la adaptabilidad en la gestión organizacional, tanto operativa como estratégica. En función de esto, al cierre del 30/09/2026, los proyectos estratégicos tienen un presupuesto total asignado de RD$228,132,056.52. De este valor, se tiene un total pagado de RD$22,800,326.45, un total comprometido de RD$150,439,988.41 y un valor disponible o pendiente de ejecución de RD$54,891,741.66.

Los proyectos aprobados para el POA 2026 son los siguientes:

Proyectos	Área responsable
Justicia ágil - 0% Mora	
Optimización Procesal Penal	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Optimización del Proceso Inmobiliario*	Dirección del Servicio Judicial y Operaciones
Modelo Operativo & Sistema Integral de Gestión de Calidad	Dirección Planificación y Desarrollo
Optimización de Notificaciones Judiciales*	Dirección del Servicio Judicial y Operaciones
Implementación del Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	Dirección Financiera
Sistema de Evaluación del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo	Dirección Gestión Humana
Interoperabilidad de la Justicia	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Implementación de IA en la Justicia	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Optimización del Sistema de Gestión de Casos*	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Justicia accesible – 100% acceso	
Reingeniería y Optimización del Portal de Acceso y Servicios Digitales*	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación
Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	Dirección Infraestructura Física
Modelo de Ciudad Judicial	Dirección Infraestructura Física
Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios*	Dirección del Servicio Judicial y Operaciones
Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	Dirección de Producción e Identidad Institucional
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	Dirección de Justicia Inclusiva
Justicia Juvenil Restaurativa	Dirección de Justicia Inclusiva
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	Dirección de Justicia Inclusiva
Justicia transparente – 100% transparencia	
Justicia abierta	Dirección de Análisis y Políticas Públicas

Transformación Digital

(*****) Proyectos que inician en el año 2026. Los demás proyectos se vienen ejecutando de años anteriores.

***Nota:** El Programa de Transformación Digital está compuesto por los proyectos: Interoperabilidad de la Justicia, Implementación de IA en la Justicia, Optimización del Sistema de Gestión de Casos y Reingeniería y Optimización del Portal de Acceso y Servicios Digitales.*

Como parte del seguimiento realizado a estos proyectos, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio, así como el porcentaje de avance general, siendo un **85.53%,** al corte del 30 de septiembre del 2026.

Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2026, al cierre del tercer trimestre.

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 30 de septiembre, 14 de los proyectos se encuentran en etapa de Ejecución y uno en etapa de Cierre. En cuanto a las fases específicas, se tienen 10 proyectos en fase de despliegue ***(incluido aquí el programa de Transformación Digital, el cual incluye 4 proyectos descritos previamente)***, 3 en fase de desarrollo, 1 en fase de piloto y 1 en fase de cierre, el cual corresponde la primera etapa de la implementación del ERP. A continuación, se presentan las gráficas y tablas correspondientes a la distribución por etapas y fases, además del estatus de por Dirección General y por proyecto:

Proyectos POA 2026 por Área Responsable/Etapa-Fase:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase

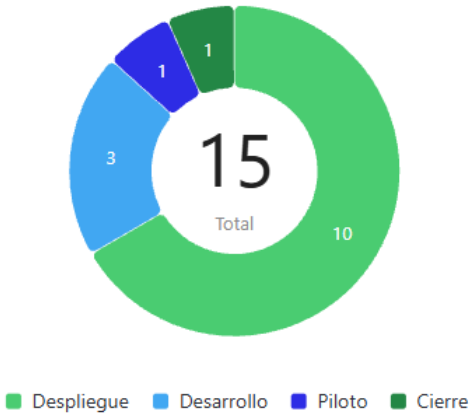


Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General

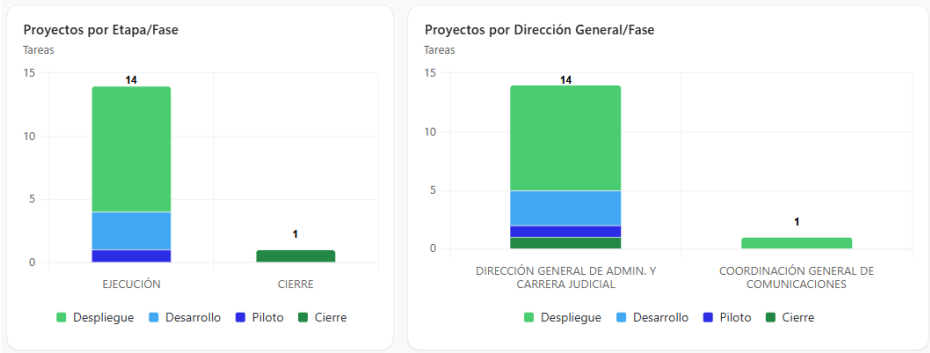


Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2026


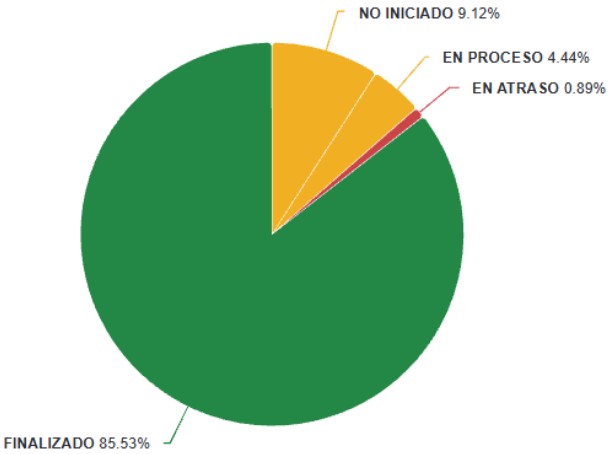


Gráfico No. 4: Estado de tareas de proyectos planificadas para el 2026

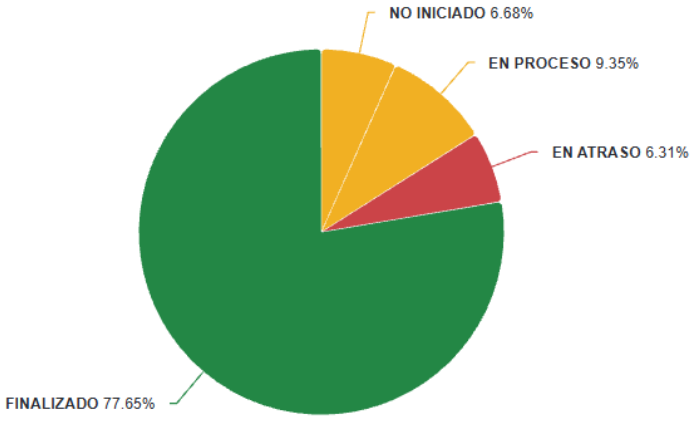

Al cierre del tercer trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general se presenta un avance del portafolio 2026 de un **85.53**%. Este avance corresponde a un progreso acumulado de los proyectos en ejecución en función de su ciclo de vida, incluyendo aquellos que iniciaron en años anteriores. En cuanto a las actividades específicas programadas a finalizar en el 2026, se reporta un avance del **77.65%**, al cierre del 30 de septiembre del 2026

Gráfico No. 5: Avance de Proyectos y Fase en la que se encuentra

Nombre	Progreso	Fase del proyecto
Optimización Penal 0% Mora	306/333	Despliegue
Optimización del Proceso Inmobiliario 0% Mora > Optimización Inmobiliaria	132/333	Desarrollo
Modelo Operativo y Sistema de Calidad 0% Mora	343/372	Despliegue
Optimización de Notificaciones Judiciales 0% Mora	27/54	Piloto
Transformación Digital 0% Mora	274/281	Despliegue
ERP: Sistema de Gestión de Recursos 0% Mora	187/233	Cierre
Evaluación del Desempeño 0% Mora	91/126	Despliegue
Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios(as) 100% Acceso	243/348	Despliegue
Adecuación de Infraestructura Digna y Accesible 100% Acceso	486/604	Despliegue
Modelo de Ciudad Judicial 100% Acceso	984/1013	Despliegue
Identidad Institucional y Portales Web 100% Acceso	252/294	Despliegue
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos 100% Acceso	317/387	Despliegue
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 100% Acceso	139/170	Despliegue
Justicia Juvenil Restaurativa 100% Acceso	45/82	Desarrollo
Justicia Abierta 100% Transparencia	228/274	Desarrollo

Avance de proyectos según su vinculación estratégica:

Dando cumplimiento al alineamiento estratégico que debe tener cada proyecto y en base al nuevo Plan Estratégico Institucional: "Justicia del Futuro 2034", se tienen vinculados al eje de **0% Mora** un total de 7 proyectos: Optimización Penal, Optimización del Proceso Inmobiliario, Optimización de Notificaciones Judiciales, Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad; ERP: Implementación Sistema de Gestión de Recursos, Sistema de Evaluación del Desempeño y Transformación Digital [Programa-4 proyectos]. Al eje del **100% Acceso** se alinean 7 proyectos: Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios, Modelo de Ciudad Judicial, Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible, Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web, Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos; Justicia Juvenil Restaurativa y Tratamiento Bajo Supervisión Judicial. Al eje de **100% Transparencia** 1 proyecto: Justicia Abierta.

Gráfico No. 6: Proyectos 2026/Eje Estratégico

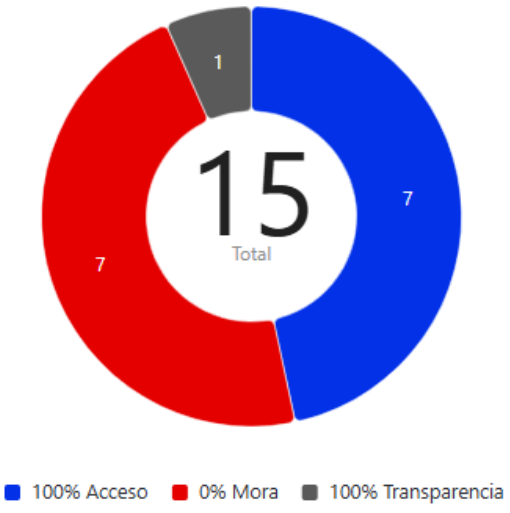


Gráfico No. 7: Avance Proyectos 2026/Eje Estratégico


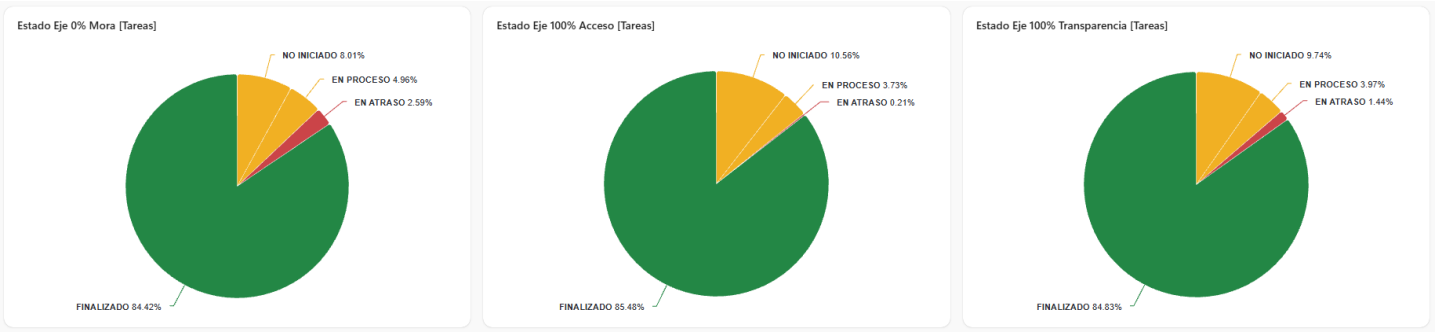


Gráfico No. 8: Avance Proyectos 2026/Objetivo Estratégico

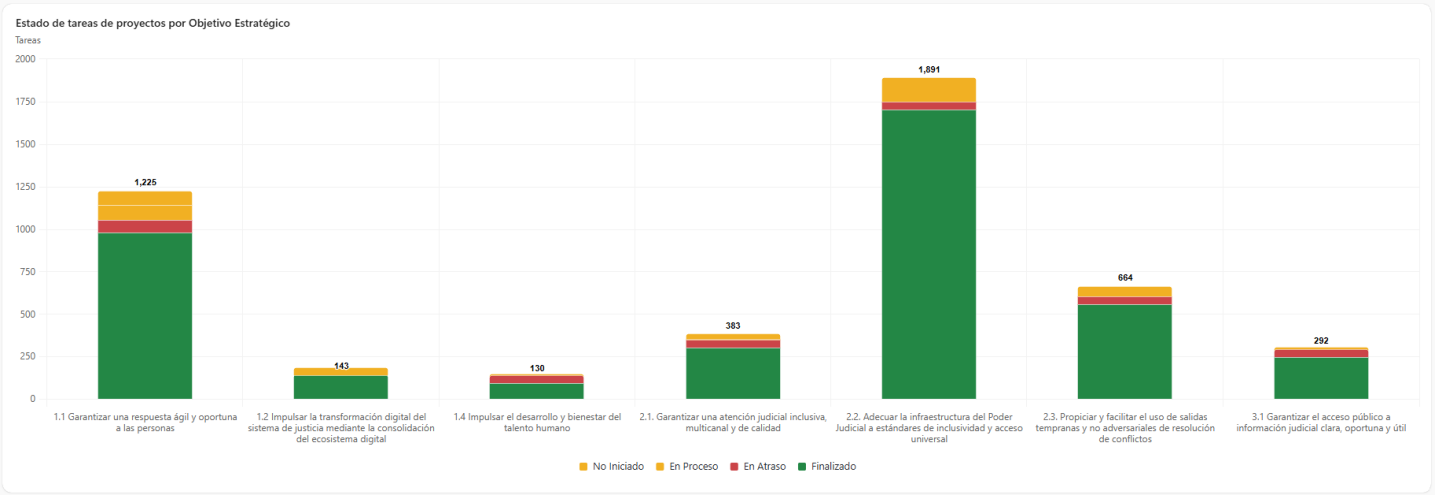

Estatus de Hitos y Entregables 2026 por Proyecto, al 30 de septiembre:

Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible 3

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Habilitación de Espacios de Formación y Asistencia Digital en 5 sedes judiciales 5	Entregable	40%	29/12/26	Dirección de Infraestructura Física
Desvelación Tarja en el Palacio de Justicia de El Seibo 5 100% acceso	Entregable	60%	25/2/27	Dirección de Infraestructura Física
Construcción del Juzgado de Paz de Cabral 9	Hito	67%	30/6/27	Dirección de Infraestructura Física
Agregar Tarea				

ERP: Sistema de Gestión de Recursos (ERP) 4

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
ERP Módulo 3: Planificación 13	Entregable	100%	13/2/26	Dirección Financiera
ERP Módulo 2b: Procesos Administrativos Operando en el Sistema de Gestión de Recursos (ERP) 18 0% mora	Entregable	100%	7/5/26	Dirección Financiera
ERP Módulo 2a: Procesos financieros operando en el sistema de gestión de recursos (ERP) 21 0% mora	Entregable	86%	20/10/26	Dirección Financiera
ERP: Módulos ENJ y RI operando en el sistema de gestión de recursos (ERP) 15 0% mora	Entregable	73%	4/11/26	Dirección Financiera

Fortalecimiento Integral Atención a Usuarios(as) 7

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Modelo de Servicio y Atención al Usuario 3 100% acceso	Entregable	100%	30/7/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Mensajería Informativa a Usuarios (WhatsApp y SMS) implementada 5 100% acceso	Hito	100%	31/8/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento a un 50% el uso del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial (tramitación Digital) Incremento de usuarios registrados en el portal Acceso Digital en un 20% 9	Entregable	100%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Oficina de Servicios Judiciales habilitada en el CENARVE (Centro Nacional de Retención de Vehículos) 8 100% acceso	Hito	75%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento a un 50% el uso del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial (tramitación Digital) 6 100% acceso	Hito	33%	30/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incremento a un 50% el uso del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial (tramitación Digital) Formación y Asistencia Digital habilitada en 5 sedes judiciales 6	Entregable	33%	30/12/27	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Formación y Asistencia Digital habilitada en 5 sedes judiciales Espacio de Formación y Asistencia Digital - Ciudad Nueva (DN) 14	Entregable	57%	30/12/27	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
+ Agregar Tarea				

Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web 1

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Programa en vivo: Justicia a un solo clic 6	Entregable	100%	22/1/26	Dirección de Producción e Identidad
+ Agregar Tarea				

Justicia Abierta 9

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Indicadores Estratégicos del PJ Centrados en las Personas publicados 7	Entregable	100%	10/4/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Política de Justicia Abierta publicada 8	Hito	100%	31/7/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Métrica de Justicia Abierta del PJ publicada 15 100% transparencia	Hito	80%	30/10/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Acuerdo de Interconexión de datos estadísticos 5	Entregable	0%	18/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Plataforma de denuncias digitales de jueces y servidores 6	Entregable	50%	18/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Diagnóstico integral del sistema judicial – Jupiter/Banco Mundial publicado 13	Entregable	69%	18/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Plan de Justicia Abierta publicado 11 100% transparencia	Hito	45%	28/12/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
Diagnóstico del Sistema de Justicia OCDE – Justice Policy Review- publicado 6	Entregable	33%	23/2/27	Dirección de Producción e Identidad
Validación del Registro de Notarios 8	Entregable	63%	19/3/27	Dirección de Análisis y Políticas Públicas

Justicia Juvenil Restaurativa 2

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Programa Justicia Juvenil Restaurativa implementado en Santiago 7 100% acceso	Hito	14%	30/12/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Programa Justicia Juvenil Restaurativa implementado en Santo Domingo 7 100% acceso	Hito	14%	30/12/26	Dirección de Justicia Inclusiva
+ Agregar Tarea				

Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos 5

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Centro de Mediación Judicial habilitado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís 10 100% acceso	Hito	100%	21/4/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Registro Inmobiliario de Higüey 10 100% acceso	Hito	80%	1/12/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Ampliación de la matrícula de mediadores de Poder Judicial [de 16 a 20 mediadores] 6 100% acceso	Entregable	50%	30/12/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Palacio de Justicia de Higüey 8 100% acceso	Hito	50%	30/12/27	Dirección de Justicia Inclusiva
Centro de Mediación Judicial habilitado en el Palacio de Justicia de San Cristóbal 11 100% acceso	Hito	45%	30/12/27	Dirección de Justicia Inclusiva
+ Agregar Tarea				

Modelo de Ciudad Judicial 3

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
100% Tribunales de Santo Domingo Este operando en la Ciudad Judicial de SDE 14 100% acceso hito	Hito	100%	19/2/26	Dirección de Infraestructura Física
Plan Maestro de la Ciudad Judicial del Distrito Nacional, recibido 4 100% acceso	Entregable	100%	30/12/26	Dirección de Infraestructura Física
Recepción de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste 5 100% acceso	Hito	60%	1/12/27	Dirección de Infraestructura Física
+ Agregar Tarea				

Modelo Operativo y Sistema Integral de Calidad 4

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Edición Piloto de Certificación de Calidad en la Justicia 6 0% mora	Entregable	100%	10/4/26	Dirección de Planificación y Desarrollo
Modelo Operativo Suprema Corte de Justicia elaborado 3 0% mora	Entregable	100%	30/6/26	Dirección de Planificación y Desarrollo
Gabinete Técnico en la Primera Sala de la SCJ implementado al 100% 16	Entregable	100%	28/8/26	Secretaría General de la Suprema (SCJ)
Tribunales a nivel nacional medidos en el 100% de estándares definidos para la Certificación de Calidad en la Justicia 5 0% mora	Hito	50%	13/11/26	Dirección de Planificación y Desarrollo

Transformación Digital 6

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Puesta en operación y lanzamiento del Portal de Servicios Digitales del Poder Judicial: justicia.gob.do Lanzamiento de la versión 3.0 del Portal de Acceso Digital 8	Entregable	100%	22/1/26	Dirección de Transformación Digital
Puesta en operación y lanzamiento del Portal de Servicios Digitales del Poder Judicial: justicia.gob.do 11 100% acceso	Hito	100%	22/1/26	Dirección de Transformación Digital
Consultas públicas habilitadas para ciudadanos(as) a través de APIs [Interconexión de sistemas de entidades públicas] 4 100% acceso 100% transparencia	Hito	100%	11/2/26	Dirección de Transformación Digital
Optimización de procesos con Inteligencia Artificial implementada en SGC y Portal de Acceso Digital 10 0% mora	Hito	100%	29/6/26	Dirección de Transformación Digital
Optimización del flujo de la materia Penal en SGC en función de los nuevos Códigos y Reglamento Ejecución de la Pena 6	Entregable	100%	30/9/26	Dirección de Transformación Digital
30% de los salones de audiencia a nivel nacional habilitados para audiencias virtuales e híbridas [15 salones adicionales] 17 100% acceso	Hito	100%	27/10/26	Dirección de Transformación Digital
+ Agregar Tarea				

Optimización de Notificaciones Judiciales 1

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Reducidas en un 50% la cantidad audiencias aplazadas por falta de Citación, en la Jurisdicción Penal de Santo Domingo Este [de 18% a 10%] 7 0% mora	Hito	43%	18/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
+ Agregar Tarea				

Optimización Procesal Penal 4

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Modelo Interinstitucional de Gestión Penal y Uso Racional de Acuerdos implementado en tres (3) Centros Privativos de Libertad 13 0% mora	Hito	79%	15/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Trámites de la materia Penal gestionados vía Portal Digital mayor o igual a un 15% 100% acceso	Hito	100%	30/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Diseño e implementación del proceso de intimación, incluyendo sus productos, reportes y alertas, logrando su puesta en funcionamiento a nivel nacional	Entregable	100%	30/12/26	Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Unidad Multidisciplinaria de Apoyo a la Justicia (UMAJ) - Fase 1 implementada [un servicio] 15 0% mora	Hito	67%	30/12/27	Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Optimización del Proceso Inmobiliario 9

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Informaciones de procesos para el seguimiento de Tribunales Inmobiliarios, publicadas en el Observatorio del Poder Judicial 7 100% transparencia	Entregable	100%	31/7/26	Dirección de Análisis y Políticas Públicas
80% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional 6 0% mora	Hito	0%	31/8/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Reducido el tiempo entre aplazamientos a no más de 30 días calendario para los deslindes y no más de 60 días para el resto de los casos [Materia Inmobiliaria] 3 0% mora	Hito	0%	30/9/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Reducido el porcentaje promedio de aplazamientos de audiencias a un máximo del 45% 9	Entregable	11%	31/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Reducido el tiempo promedio de espera para la primera audiencia a un máximo de 60 días para procesos de saneamiento, a 30 días o menos para casos de deslinde y para las litis sobre derechos registrados a 45 días o menos 4 0% mora	Hito	0%	31/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Tasa de solución de asuntos contenciosos en materia Inmobiliaria mayor o igual 100% 12 0% mora	Hito	58%	31/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Tasa de solución de asuntos secretariales en Materia Inmobiliaria mayor o igual a un 100% 12 0% mora	Hito	67%	31/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Trámites de la materia Inmobiliaria gestionados vía Portal de Acceso Digital mayor o igual a un 35% 9 100% acceso	Hito	89%	31/12/26	Dirección de Servicio Judicial y Operaciones
Incrementado en un 30% el uso de la Regularización Parcelaria en Mensuras Catastrales como vía alternativa al Deslinde 3 0% mora	Hito	0%	31/12/26	Registro Inmobiliario
+ Agregar Tarea				

Sistema de Evaluación del Desempeño 1

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Política de Evaluación Desempeño Administrativa aprobada 14	Entregable	71%	16/11/26	Dirección de Gestión Humana
+ Agregar Tarea				

Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 3

Nombre	Tipo de tarea	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en Santo Domingo 13 100% acceso	Hito	100%	30/4/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en San Cristóbal 14 100% acceso	Hito	100%	31/8/26	Dirección de Justicia Inclusiva
Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado Distrito Nacional 15 100% acceso	Hito	87%	30/12/26	Dirección de Justicia Inclusiva

Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2026 (Recursos internos).

A continuación, se presentan las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2026, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 30 de septiembre de 2026. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2026

Proyecto	Presupuesto RD$	Pagado RD$	Comprometido RD$	Disponible RD$
Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	122,758,468.67	5,960,643.07	109,204,879.91	7,592,945.69
Transformación Digital	88,715,218.55	13,097,378.28	37,809,254.72	37,808,585.55
Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad	4,833,773.83	$0.00	$0.00	4,833,773.83
Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	4,541,334.40	1,634,217.40	733,419.56	2,173,697.44
Modelo de Ciudad Judicial	3,941,800.00	1,889,087.70	692,434.22	1,360,278.08
Justicia Abierta	2,000,000.00	$0.00	2,000,000.00	$0.00
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	933,774.54	219,000.00	$0.00	714,774.54
Optimización Procesal Penal	407,686.53	$0.00	$0.00	407,686.53
Fortalecimiento Integral de la Atención a Usuarios(as)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Justicia Juvenil Restaurativa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Optimización de Notificaciones Judiciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Optimización del Proceso Inmobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Sistema de Evaluación del Desempeño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total general	**228,132,056.52**	**22,800,326.45**	**150,439,988.41**	**54,891,741.66**


Fuente: *Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 08/10/2026.*

Nota: *Aquellos proyectos que no tienen asignación presupuestaria para este año, se están ejecutando con capacidad operativa interna, sin la necesidad de recursos adicionales.*

Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos 2026



Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria de proyectos al 30/09/2026

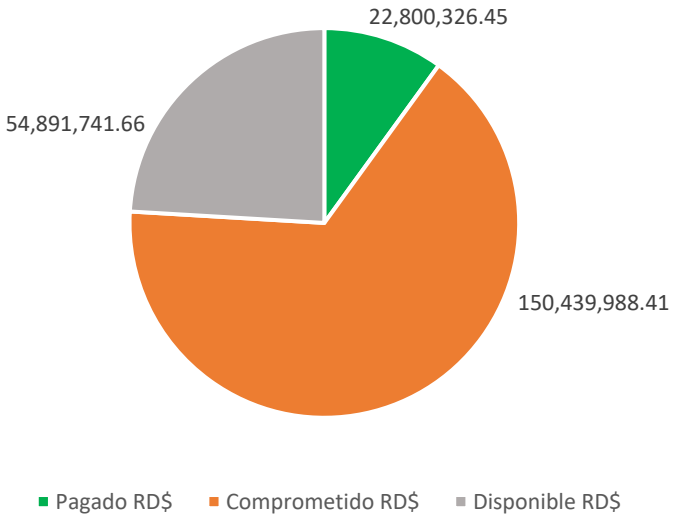

Elaborado:
Esperanza Adames L.
Gerente de Proyectos

Visto:
Isnelda Guzmán
Directora de Planificación y Desarrollo

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Esperanza Adames Liranzo
Isnelda R. Guzman De Jesus
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/K4W5-15IL-Z2UH-EH1B
